



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Prefeitura Municipal de Bom Lugar

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 20482 - UCHOA ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	:	12010001
C.P.F./C.N.P.J	:	10.811.637/0001-11
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA:	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 244 0022 1.031 4.4.90.51.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 625.254,40



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 12010001

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício de 2024

Data: 12/01/2024

Modalidade: global

INTERESSADO

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000

C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
Func.programática 08 244 0022 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de
Habitações Populares
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Subelemento..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
Fonte de recurso..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação

Modalidade. Concorrência

Número do processo..... 001-2023-CONCO

Exercício.. 2023

Código contrato..... 120501001/2023

Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior
654.954,40

valor empenhado
625.254,40

saldo disponível
29.700,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA. Conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº120501001/2023, decorrente de concorrência pública nº001/2023.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	034036 Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Pad	625.254,40	625.254,40

Bom Lugar, 12 de Janeiro de 2024.
Autorizo

AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA MIRANDA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 20482 - UCHOA ENGENHARIA LTDA

EMPENHO	:	12010001
C.P.F./C.N.P.J	:	10.811.637/0001-11
ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID.ORÇAMENTÁRIA	:	13 - Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO	:	08 244 0022 1.031 4.4.90.51.00
VALOR EMPENHADO	:	R\$ 625.254,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



Processo:	03000112019
Fls.:	63
Assinatura:	

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120501001/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Rua Manoel Severo, S/N, centro, CEP: 65.704-000, CNPJ (MF) Nº 01.611.400/0001-04, Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social neste ato representado pela Secretária, a Sra. **FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA**, portadora do CPF nº 025.500.623-37, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 10.811.637/0001-11, com sede na Rua São Francisco, nº 112, Centro, Igarapé Grande- MA, CEP: 65.720-000, neste ato representado pela Sra. **Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchôa Galvão** portador do RG. nº038210912009-0 – SSP MA e do CPF nº 604.745.393-77, qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 9,78% de alguns itens do **CONTRATO Nº 120501001/2023, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**, e a empresa: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, para a prestação de serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA, conforme **CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023**.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ADITIVO

O resultado do aditivo dos quantitativos, importou em R\$124.328,88 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), de acordo com a planilha constante nos autos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	0213 – Fundo Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	08.244.0032.1.031 – Construção, Ampliação e Recuperação de Habitações Populares.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
FONTE DE RECURSO:	1500000000 Recurso não vinculado de impostos.

CLÁUSULA QUARTA:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



Processo	1201001/12023
Fls.:	64
Referência	o presente

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

BOM LUGAR – MA, 12 de janeiro de 2024.

Fabiane Beatriz de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA

CPF: 498.934.243-72

Secretária Municipal de Assistência Social

Contratante

UCHOA

ENGENHARIA

LTDA: 108116370

00111

Assinado de forma

digital por UCHOA

ENGENHARIA

LTDA: 10811637000111

Dados: 2024.01.12

14:40:41 -03'00'

UCHOA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: nº 10.811.637/0001-11

Contratada

TESTEMUNHAS:

1)

Alan Torres Gonçalves

CPF

912.371.063-20

2)

ALAN TORRES GONÇALVES

CPF

60977046369



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16020001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 16/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 12010001 VALOR..... R\$ 625.254,40
DATA DO EMPENHO... 12/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, n° 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC. PROGRAMÁTICA 08 244 0032 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de
Habitacões Populares
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão	288.439,84	288.439,84

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 288.439,84
Nota fiscal serviço 68 Série E
Chave de acesso
(estad./munic.): 90E55SMgHOX0D7815GLm
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº68.

Bom Lugar, 16 de Fevereiro de 2024.

José Oliveira César

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS

PROC. 0301001/2023

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, o Eng.º Civil VINICIUS MACHADO SANTOS, responsável técnico do contrato nº 120501001/2023, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o representante da empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, por seu representante legal, THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, procederam completa vistoria nos serviços executados, observando os projetos e especificações técnicas, para efeito de Recebimento Provisório dos serviços discriminados a seguir.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33 (trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Homologação: 14/04/2023

Publicação no Diário Oficial do Município - DOM: 14/04/2023

Data de assinatura do Contrato: 12/05/2023

Prazo de execução do Contrato: 180 dias

Data de recebimento da Ordem de Serviço: 12/05/2023

Valor contratado: R\$ 1.270.816,64 (um milhão e duzentos e setenta e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)

Valor pago: R\$ 288.439,84 (duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Termos aditivos: 1º termo de vigência, vigente até 05 de maio de 2024.

Bom Lugar (MA) 16 de fevereiro de 2024


VINICIUS MACHADO SANTOS
CREA-MA Nº 112101306-6
CPF: 073.614.733-00

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.02.16 10:04:13
-03'00'

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA Nº. 1118296079
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-MA
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Email: prefeitura. municipiobomlugar@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br



Estado do Maranhão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Rua Manoel Severo, S/N, Centro
15.529.541/0001-89

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400154

À
UCHOA ENGENHARIA LTDA
Rua São Francisco, nº 112
CENTRO - Igarapé Grande/MA

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Concorrência nº 001-2023-CONCO - Contrato nº 120501001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 27/02/2023, empenho nº 12010001, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1 Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão Especificação: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.		1,0000	288.439,840	288.439,84
TOTAL.:				288.439,84

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Concorrência nº 001-2023-CONCO), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.529.541/0001-89.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no
Pag.: 0001



dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 16 de Fevereiro de 2024

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
C.N.P.J. (MF). 15.529.541/0001-89

Ciente e de acordo em ____/____/____.

UCHOA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J(MF) 10.811.637/0001-11



IGARAPÉ GRANDE – MA, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

A UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, CEP 65.720-000, IGARAPÉ GRANDE –MA, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SRA. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, BRASILEIRA, CASADA, NATURAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0 E CPF Nº 604.745.393-77, VEM POR MEIO DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NOS DADOS ABAIXO:

5ª MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

VALOR DO OBJETO: R\$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR DO ADITIVO: R\$124.328,88 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

VALOR A IMPORTAR: R\$ 288.439,84 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11

TERMO DE CONTRATO Nº 120501001/2023

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 2124-5

CONTA CORRENTE 80000-7

BANCO DO BRASIL

NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVÃO:60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVÃO:60474539377
Dados: 2024.02.16 09:55:17
-03'00'

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
CPF: 604.745.393-77
REPRESENTANTE LEGAL



99 98407.7832



construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

UCHÔA



99 98407.7832



construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | ((99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE -
MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Para verificar autenticidade desta
Nota, escaneie o QR Code ao lado,
Ou acessando o link:



<https://nfse.igarapegrande.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0068
EMISSÃO: 16/02/2024 10:02:34
CÓDIGO VERIFICADOR:
90E55SMqHOx0D7815GLm

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 10.811.637/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO Nº: 112
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF / CNPJ: 01.611.400/0001-04
ENDEREÇO: RUA MANOEL SEVERO Nº: s/n
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: uchoaeng.edifica@gmail.com

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☒ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 16/02/2024

Jose Oliveira Cesar
José Oliveira César
Matricula nº 1432-1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5º MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 120501001/2023 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA

Descrição			Quantidade	Valor	Valor total
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			1	R\$ 288.439,84	R\$ 288.439,84
PIS (0,00%) *R\$ 0,00	COFINS (0,00%) *R\$ 0,00	INSS (0,00%) *R\$ 0,00	IR (0,00%) *R\$ 0,00	CSLL (0,00%) *R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 288.439,84

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 288.439,84	ALÍQUOTA DO ISS 2,00%	VALOR DO ISS R\$ R\$ 5.768,80
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 2/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: BOM LUGAR - MA
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SERVIÇO: 702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCR
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 16/02/2024 11:47:15 na guia Nº 220249581

Expedido(a) em: 16/02/2024 11:59:35



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Processo: 0301004 / 2023
Fls.: 52
Rubrica: [assinatura]

Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230644614

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1118296079

Registro: 1118296079MA

Empresa contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005403022-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

RUA MANOEL SEVERO

Nº: SN

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM LUGAR

UF: MA

CEP: 65704000

Contrato: 120501001/2023

Celebrado em: 12/05/2023

Valor: R\$ 1.270.816,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL SEVERO

Nº: SN

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM LUGAR

UF: MA

CEP: 65704000

Data de início: 12/05/2023

Previsão de término: 08/11/2023

Coordenadas Geográficas: -4.371670, -45.032134

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	33,00	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	33,00	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	33,00	m
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	33,00	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	33,00	m
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	33,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 28wb4 impresso em: 15/05/2023 às 13:58:21 por: ip: 200.25.52.196

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

teleconsorcio@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Processo: 0301004 / 2023
Fis.: 53
Rubrica: 
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230644614

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2023.05.15 14:59:34
-03'00'

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Pontal do Sol de maio de 2023
Local data

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO - CPF
604.745.393-77

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 15/05/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8304716204

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar/> com a chave: 29wt4
Impresso em: 15/05/2023 às 13:58:21 por: ip: 200.25.52.196

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230669215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

VINICIUS MACHADO SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1121013066

Registro: 1121013066MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOM LUGAR

RUA Manoel Severo

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: centro

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Nº: sn

CEP: 65704000

Contrato: 120501001/2023

Celebrado em: 12/05/2023

Valor: R\$ 1.270.816,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA manoel severo

Nº: sn

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: BOM LUGAR

UF: MA

CEP: 65704000

Data de Início: 12/05/2023

Previsão de término: 12/11/2023

Coordenadas Geográficas: -4.371670, -45.032134

Finalidade: Residencial

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

33,00

un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

33,00

un

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

33,00

un

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS

33,00

un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

33,00

un

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

33,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização da prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

- Cláusula Compromissória. Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

AEAMA - ASSOC DOS ENG AGRON DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bom Lugar-MA, 27 de julho de 2023

Local

data

Vinicius Machado Santos

VINICIUS MACHADO SANTOS - CPF: 073.614.733-00

Felipe P de Oliveira

MUNICIPIO DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 27/07/2023

Valor pago: R\$ 254,59

Nosso Número: 8304871432

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 12bc4
impresso em: 27/07/2023 às 09:37:56 por: ip: 192.168.100.1

www.crema.org.br

faleconosco@crema.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300






		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM		PERÍODO	MEDICÃO
quarta-feira, 10 de janeiro de 2024		sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024			005
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR				
CONTRATADO	UCHOA ENGENHARIA LTDA: CNPJ: 10.811.637/0001-11.				
CONTRATO	Nº 120501001/2023				
ENDEREÇO	BOM LUGAR-MA				

 Latitude: 4°16.483'S Longitude: 45°3.146'W Elevação: 38.87±13.49 m		 Latitude: 4°16.483'S Longitude: 45°3.142'W Elevação: 38.03±12.48 m	
Foto 01:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Foto 02:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 Latitude: 4°16.467'S Longitude: 45°3.138'W Elevação: 37.20±7.02 m		 Latitude: 4°16.484'S Longitude: 45°3.143'W Elevação: 39.10±3.36 m	
Foto 03:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Foto 04:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 Latitude: 4°16.484'S Longitude: 45°3.139'W Elevação: 38.21±8.48 m		 Latitude: 4°16.552'S Longitude: 45°2.947'W Elevação: 41.86±7.74 m	
Foto 05:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Foto 06:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

[Handwritten signature]

	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	PERÍODO	MEDIDAÇÃO	PÁGINA
quarta-feira, 10 de janeiro de 2024	sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024		005	002 de 002
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR			
CONTRATADO	UCHOA ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 10.811.637/0001-11.			
CONTRATO	Nº 120501001/2023			
ENDEREÇO	BOM LUGAR-MA			

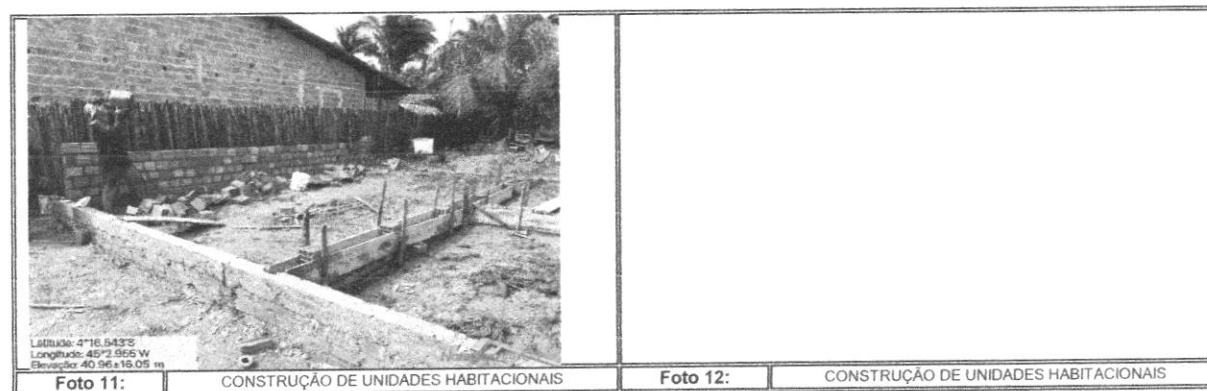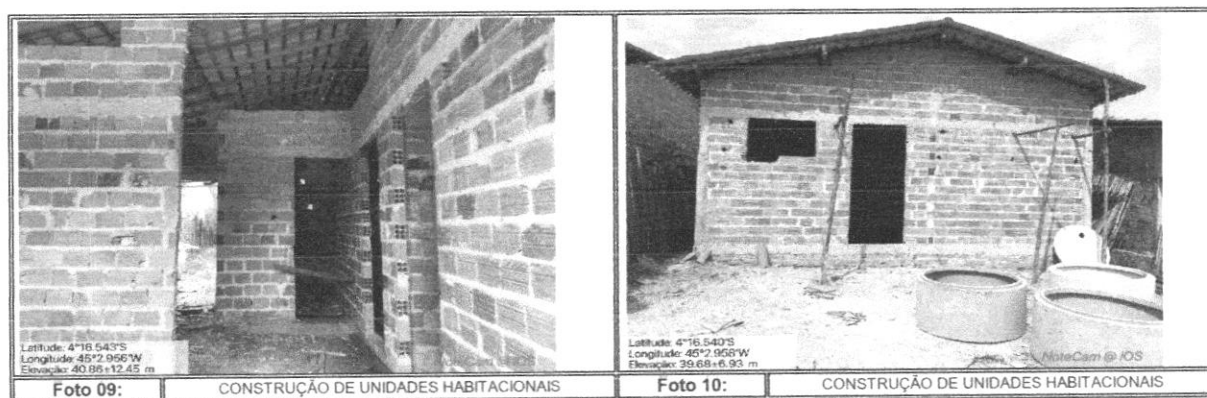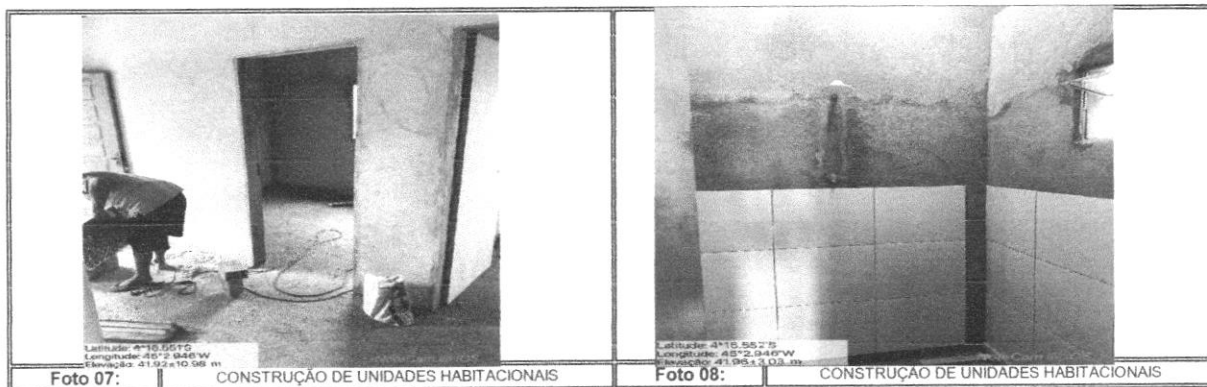

Vinicius Machado Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 112101306-6



BOLETIM DE MEDIÇÃO

5ª MEDIÇÃO 16/02/2024	CONTRATO Nº 120501001/2023 ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230644614	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. VALOR DO OBJETO: R\$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). VALOR DO ADITIVO: R\$124.328,88 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657-20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM		

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

CONTRATO + 2º ADITIVO																						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO ATUAL					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1 SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 5.009,03					R\$ 910,73	18,18%		R\$ 3.946,49	78,79%						
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVADEIA AF_05/2018	m²	1.980,00	R\$ 2,53	R\$ 5.009,03	1200,00	R\$ 3.035,76	60,61%	360,00	R\$ 910,73	18,18%	1.560,00	R\$ 3.946,49	78,79%	420,00	R\$ 1.062,54	21,21%			
2 MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 17.351,36 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>R\$ 3.154,78<th>18,18%<th></th><th>R\$ 13.670,71<th>78,79%<th></th><th>R\$ 3.680,65<th>21,21%</th></th></th></th></th></th>					R\$ 3.154,78 <th>18,18%<th></th><th>R\$ 13.670,71<th>78,79%<th></th><th>R\$ 3.680,65<th>21,21%</th></th></th></th></th>	18,18% <th></th> <th>R\$ 13.670,71<th>78,79%<th></th><th>R\$ 3.680,65<th>21,21%</th></th></th></th>		R\$ 13.670,71 <th>78,79%<th></th><th>R\$ 3.680,65<th>21,21%</th></th></th>	78,79% <th></th> <th>R\$ 3.680,65<th>21,21%</th></th>		R\$ 3.680,65 <th>21,21%</th>	21,21%			
2.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	165,00	R\$ 80,31	R\$ 13.250,76	100,00	R\$ 8.030,73	60,61%	30,00	R\$ 2.409,27	18,18%	130,00	R\$ 10.439,95	78,79%	35,00	R\$ 2.810,81	21,21%			
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	99,00	R\$ 41,42	R\$ 4.100,60	60,00	R\$ 2.485,20	60,61%	18,00	R\$ 745,56	18,18%	78,00	R\$ 3.230,76	78,79%	21,00	R\$ 869,84	21,21%			
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							R\$ 149.082,07 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>R\$ 27.105,82<th>18,18%<th></th><th>R\$ 117.458,55<th>78,79%<th></th><th>R\$ 31.623,52<th>21,21%</th></th></th></th></th></th>					R\$ 27.105,82 <th>18,18%<th></th><th>R\$ 117.458,55<th>78,79%<th></th><th>R\$ 31.623,52<th>21,21%</th></th></th></th></th>	18,18% <th></th> <th>R\$ 117.458,55<th>78,79%<th></th><th>R\$ 31.623,52<th>21,21%</th></th></th></th>		R\$ 117.458,55 <th>78,79%<th></th><th>R\$ 31.623,52<th>21,21%</th></th></th>	78,79% <th></th> <th>R\$ 31.623,52<th>21,21%</th></th>		R\$ 31.623,52 <th>21,21%</th>	21,21%			
3.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 - ALICERCE E BALDRAME	m³	66,00	R\$ 909,66	R\$ 60.037,80	40,00	R\$ 36.386,53	60,61%	12,00	R\$ 10.915,96	18,18%	52,00	R\$ 47.302,49	78,79%	14,00	R\$ 12.735,31	21,21%			
3.2	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 - ELEMENTOS, SAPATAS, PILARES VIGAS SUPERIORES E INFERIORES/ LAJES	m³	127,05	R\$ 700,86	R\$ 89.044,27	77,00	R\$ 53.966,20	60,61%	23,10	R\$ 16.189,86	18,18%	100,10	R\$ 70.156,06	78,79%	26,95	R\$ 18.888,21	21,21%			
4 ALVENARIA E PAINÉIS							R\$ 255.926,86 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>R\$ 58.143,30<th>22,72%<th></th><th>R\$ 188.092,56<th>73,49%<th></th><th>R\$ 67.834,30<th>26,51%</th></th></th></th></th></th>					R\$ 58.143,30 <th>22,72%<th></th><th>R\$ 188.092,56<th>73,49%<th></th><th>R\$ 67.834,30<th>26,51%</th></th></th></th></th>	22,72% <th></th> <th>R\$ 188.092,56<th>73,49%<th></th><th>R\$ 67.834,30<th>26,51%</th></th></th></th>		R\$ 188.092,56 <th>73,49%<th></th><th>R\$ 67.834,30<th>26,51%</th></th></th>	73,49% <th></th> <th>R\$ 67.834,30<th>26,51%</th></th>		R\$ 67.834,30 <th>26,51%</th>	26,51%			
4.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	2.363,32	R\$ 108,29	R\$ 255.926,86	1200,00	R\$ 129.949,26	50,78%	536,92	R\$ 58.143,30	22,72%	1.736,92	R\$ 188.092,56	73,49%	626,40	R\$ 67.834,30	26,51%			
5 COBERTURA							R\$ 234.978,21 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>R\$ 42.723,30<th>18,18%<th></th><th>R\$ 185.134,27<th>78,79%<th></th><th>R\$ 49.843,94<th>21,21%</th></th></th></th></th></th>					R\$ 42.723,30 <th>18,18%<th></th><th>R\$ 185.134,27<th>78,79%<th></th><th>R\$ 49.843,94<th>21,21%</th></th></th></th></th>	18,18% <th></th> <th>R\$ 185.134,27<th>78,79%<th></th><th>R\$ 49.843,94<th>21,21%</th></th></th></th>		R\$ 185.134,27 <th>78,79%<th></th><th>R\$ 49.843,94<th>21,21%</th></th></th>	78,79% <th></th> <th>R\$ 49.843,94<th>21,21%</th></th>		R\$ 49.843,94 <th>21,21%</th>	21,21%			
5.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1.650,00	R\$ 76,74	R\$ 126.623,72	1000,00	R\$ 76.741,63	60,61%	300,00	R\$ 23.022,49	18,18%	1300,00	R\$ 99.764,12	78,79%	350,00	R\$ 26.859,60	21,21%			
5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1.650,00	R\$ 47,48	R\$ 78.339,91	1000,00	R\$ 47.478,72	60,61%	300,00	R\$ 14.243,62	18,18%	1300,00	R\$ 61.722,34	78,79%	350,00	R\$ 16.617,57	21,21%			
5.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_07/2019	M	1.029,60	R\$ 22,70	R\$ 23.367,94	624,00	R\$ 14.162,36	60,61%	187,20	R\$ 4.248,71	18,18%	811,20	R\$ 18.411,07	78,79%	218,40	R\$ 4.956,87	21,21%			
5.4	94221	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	270,60	R\$ 24,56	R\$ 6.646,64	164,00	R\$ 4.028,26	60,61%	49,20	R\$ 1.208,48	18,18%	213,20	R\$ 5.236,74	78,79%	57,40	R\$ 1.409,90	21,21%			
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E CHAPA GALVANIZADA							R\$ 207.778,10 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>R\$ 47.026,57<th>22,63%<th></th><th>R\$ 152.911,40<th>73,59%<th></th><th>R\$ 54.866,70<th>26,41%</th></th></th></th></th></th>					R\$ 47.026,57 <th>22,63%<th></th><th>R\$ 152.911,40<th>73,59%<th></th><th>R\$ 54.866,70<th>26,41%</th></th></th></th></th>	22,63% <th></th> <th>R\$ 152.911,40<th>73,59%<th></th><th>R\$ 54.866,70<th>26,41%</th></th></th></th>		R\$ 152.911,40 <th>73,59%<th></th><th>R\$ 54.866,70<th>26,41%</th></th></th>	73,59% <th></th> <th>R\$ 54.866,70<th>26,41%</th></th>		R\$ 54.866,70 <th>26,41%</th>	26,41%			
6.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	66,00	R\$ 857,28	R\$ 56.580,35	40,00	R\$ 34.291,10	60,61%	12,00	R\$ 10.287,33	18,18%	52,00	R\$ 44.578,43	78,79%	14,00	R\$ 12.001,92	21,21%			
6.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	82,30	R\$ 1.065,51	R\$ 87.904,25	50,00	R\$ 53.275,29	60,61%	15,00	R\$ 15.982,59	18,18%	65,00	R\$ 69.257,88	78,79%	17,50	R\$ 18.646,37	21,21%			

2008

Assinado eletronicamente por:
THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA
RUA UCHOA
GALVAO/60474533377
401547

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657-20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

BOLETIM DE MEDICÃO

5ª MEDIÇÃO 16/02/2024	CONTRATO Nº 120501001/2023 ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230644614	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. VALOR DO OBJETO: R\$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). VALOR DO ADITIVO: R\$124.328,88 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS). UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657-20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM
--------------------------	---	---

6.3	100669	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019											49,76	R\$ 1.271,98	R\$ 63.293,50	14,40	R\$ 18.316,44	28,94%	16,32	R\$ 20.758,65	32,80%	30,72	R\$ 39.075,09	61,74%	19,04	R\$ 24.218,41	38,26%	
7		PISOS																											
7.1	87622	SINAPI	m²	1.320,00	R\$ 36,22	R\$ 47.816,43	800,00	R\$ 28.979,64	60,61%	240,00	R\$ 8.693,89	18,18%	1040,00	R\$ 37.673,53	78,79%	280,00	R\$ 10.142,90	21,21%				R\$ 77.566,41	78,79%		R\$ 20.883,31	21,21%			
7.2	98681	SINAPI	m²	1.320,00	R\$ 38,36	R\$ 50.633,29	800,00	R\$ 30.686,83	60,61%	240,00	R\$ 9.206,05	18,18%	1040,00	R\$ 39.897,88	78,79%	280,00	R\$ 10.740,41	21,21%				R\$ 75.938,90	64,91%		R\$ 41.050,33	35,09%			
8		REVESTIMENTO																											
8.1	87905	SINAPI	m²	4.326,65	R\$ 8,45	R\$ 36.567,90	2000,00	R\$ 16.903,56	46,23%	1073,84	R\$ 9.075,86	24,82%	3073,84	R\$ 25.979,42	71,04%	1252,81	R\$ 10.588,48	28,96%											
8.2	104234	SINAPI	m²	2.023,24	R\$ 39,75	R\$ 80.421,33	600,00	R\$ 23.849,27	29,66%	656,88	R\$ 26.110,21	32,47%	1256,88	R\$ 49.959,48	62,12%	766,36	R\$ 30.461,85	37,88%											
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																											
9.1	89356	SINAPI	M	116,49	R\$ 21,32	R\$ 2.483,21	70,60	R\$ 1.504,96	60,61%	21,18	R\$ 451,49	18,18%	91,78	R\$ 1.956,45	78,79%	24,71	R\$ 576,76	21,21%											
9.2	89403	SINAPI	M	943,47	R\$ 21,73	R\$ 20.500,76	571,80	R\$ 12.424,69	60,61%	171,54	R\$ 3.727,41	18,18%	743,34	R\$ 16.152,10	78,79%	200,13	R\$ 4.348,66	21,21%											
9.3	94792	SINAPI	UN	99,00	R\$ 137,00	R\$ 13.563,23	60,00	R\$ 8.220,13	60,61%	18,00	R\$ 2.466,04	18,18%	78,00	R\$ 10.686,17	78,79%	21,00	R\$ 2.877,06	21,21%											
9.4	94498	SINAPI	UN	33,00	R\$ 174,09	R\$ 5.745,07	20,00	R\$ 3.481,84	60,61%	6,00	R\$ 1.044,55	18,18%	26,00	R\$ 4.526,39	78,79%	7,00	R\$ 1.218,68	21,21%											
9.5	94792	SINAPI	UN	33,00	R\$ 137,00	R\$ 4.521,07	20,00	R\$ 2.740,03	60,61%	6,00	R\$ 822,01	18,18%	26,00	R\$ 3.562,04	78,79%	7,00	R\$ 959,03	21,21%											
9.6	86877	SINAPI	UN	33,00	R\$ 108,50	R\$ 3.580,49	20,00	R\$ 2.169,96	60,61%	6,00	R\$ 650,99	18,18%	26,00	R\$ 2.820,95	78,79%	7,00	R\$ 759,54	21,21%											
9.7	86880	SINAPI	UN	33,00	R\$ 29,81	R\$ 983,72	20,00	R\$ 596,16	60,60%	6,00	R\$ 178,85	18,18%	26,00	R\$ 775,01	78,78%	7,00	R\$ 208,71	21,22%											
9.8	94799	SINAPI	UN	33,00	R\$ 186,10	R\$ 6.141,39	20,00	R\$ 3.722,04	60,61%	6,00	R\$ 1.116,61	18,18%	26,00	R\$ 4.838,65	78,79%	7,00	R\$ 1.302,74	21,21%											
9.9	89714	SINAPI	M	198,00	R\$ 45,35	R\$ 8.979,83	120,00	R\$ 5.442,30	60,61%	36,00	R\$ 1.632,69	18,18%	156,00	R\$ 7.074,99	78,79%	42,00	R\$ 1.904,84	21,21%											
9.10	89712	SINAPI	M	396,00	R\$ 27,24	R\$ 10.788,25	240,00	R\$ 6.538,32	60,61%	72,00	R\$ 1.961,50	18,18%	312,00	R\$ 8.499,82	78,79%	84,00	R\$ 2.288,43	21,21%											
9.11	89495	SINAPI	UN	66,00	R\$ 21,14	R\$ 1.395,45	40,00	R\$ 845,70	60,60%	12,00	R\$ 253,71	18,18%	52,00	R\$ 1.099,41	78,79%	14,00	R\$ 296,04	21,21%											
9.12	86882	SINAPI	UN	66,00	R\$ 24,85	R\$ 1.640,05	40,00	R\$ 993,96	60,61%	12,00	R\$ 298,19	18,18%	52,00	R\$ 1.292,15	78,79%	14,00	R\$ 347,90	21,21%											
9.13	102605	SINAPI	UN	33,00	R\$ 340,76	R\$ 11.244,98	20,00	R\$ 6.815,13	60,61%	6,00	R\$ 2.044,54	18,18%	26,00	R\$ 8.859,67	78,79%	7,00	R\$ 2.385,31	21,21%											

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:604745393.17
Dados: 2024.02.16 09:54:19
+03'00"

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.02.16 09:54:19
+03:00'

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112 - CENTRO | CEP: 657 20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832-EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

5ª MEDIÇÃO
16/02/2024

CONTRATO Nº
120501001/2023
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230644614

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.
VALOR DO OBJETO: R\$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).
VALOR DO ADITIVO: R\$124.328,88 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

10	APARELHOS	UN	R\$ 78.330,80	R\$ 47.473,15	60,61%	R\$ 14.241,95	18,18%	R\$ 61.715,10	78,79%	R\$ 16.615,70	21,21%
10.1	95469 SINAPI	UN	R\$ 319,42	20,00	60,61%	R\$ 1.916,54	18,18%	R\$ 8.305,00	78,79%	R\$ 2.235,99	21,21%
10.2	86903 SINAPI	UN	R\$ 374,55	20,00	60,61%	R\$ 2.247,28	18,18%	R\$ 9.738,21	78,79%	R\$ 2.621,87	21,21%
10.3	93442 SINAPI	UN	R\$ 1.679,69	20,00	60,61%	R\$ 10.078,13	18,18%	R\$ 43.671,89	78,79%	R\$ 11.757,84	21,21%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 108.179,00	R\$ 65.562,87	60,61%	R\$ 19.668,87	18,18%	R\$ 85.231,74	78,79%	R\$ 22.947,26	21,21%
11.1	91996 SINAPI	UN	R\$ 32,06	80,00	60,61%	R\$ 769,50	18,18%	R\$ 3.334,51	78,79%	R\$ 897,79	21,21%
11.2	97589 SINAPI	UN	R\$ 38,01	120,00	60,61%	R\$ 1.368,47	18,18%	R\$ 5.930,03	78,79%	R\$ 1.596,59	21,21%
11.3	91953 SINAPI	UN	R\$ 27,39	80,00	60,61%	R\$ 657,34	18,18%	R\$ 2.848,46	78,79%	R\$ 766,91	21,21%
11.4	101876 SINAPI	UN	R\$ 101,22	20,00	60,61%	R\$ 607,33	18,18%	R\$ 2.631,76	78,79%	R\$ 708,56	21,21%
11.5	91927 SINAPI	M	R\$ 6,11	2800,00	60,61%	R\$ 5.135,26	18,18%	R\$ 22.252,79	78,79%	R\$ 5.991,17	21,21%
11.6	91929 SINAPI	M	R\$ 8,62	1300,00	60,61%	R\$ 3.360,13	18,18%	R\$ 14.560,56	78,79%	R\$ 3.920,18	21,21%
11.7	91837 SINAPI	M	R\$ 16,56	1300,00	60,61%	R\$ 6.458,62	18,18%	R\$ 27.987,34	78,79%	R\$ 7.535,08	21,21%
11.8	93653 SINAPI	UN	R\$ 12,49	80,00	60,61%	R\$ 299,64	18,18%	R\$ 1.298,44	78,79%	R\$ 349,60	21,21%
11.9	96986 SINAPI	UN	R\$ 168,76	20,00	60,61%	R\$ 1.012,58	18,18%	R\$ 4.387,85	78,79%	R\$ 1.181,38	21,21%
12	PINTURA		R\$ 31.503,64	R\$ 19.093,10	60,61%	R\$ 5.727,93	18,18%	R\$ 24.821,03	78,79%	R\$ 6.682,61	21,21%
12.1	95623 SINAPI	m²	R\$ 11,93	1600,00	60,61%	R\$ 5.727,93	18,18%	R\$ 24.821,03	78,79%	R\$ 6.682,61	21,21%
			R\$ 1.395.145,52	R\$ 770.191,12	55,21%	R\$ 288.439,84	20,67%	R\$ 1.058.630,96	75,88%	R\$ 336.514,56	24,12%

IMPORTA O VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO EM: R\$ 288.439,84 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVÃO: 60474539377
Assinado de forma digital por THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA
Data: 2024.02.16 09:54:29 -03'00'

THAYLA CRISTINA GOMES DA UCHOA GALVAO
CREA/MA 111829607-9
ENGENHEIRA CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICA
EXECUTORA

Vinicius Machado Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112101306-6

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO| CEP: 657.20-000| IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711| (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.811.637/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:35:11 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **F045.E22B.A8CD.FA51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007524/24

Data da

27/01/2024 09:19:23

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/02/2024 12:43:40



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 333259/23

Data da

16/11/2023 15:37:11

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/12/2023 08:42:37



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Rua São Francisco, S/N, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 001/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas no sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquer débitos de inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido contribuinte, Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 02 DE JANEIRO DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.673.953-87

Jair Marinho Santos

DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO

Pref. Municipal de Igarapé Grande

Mat. 000011



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD

Rua São Francisco, S/N, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 001/2024


Certificamos após a realização das consultas procedidas nos arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito municipal sob quaisquer impostos que exista (IPTU, TST, TCF, ISSQN, TLVF, FORUS e LAVAÉMIOS), a esta Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 02 DE JANEIRO DE 2024.



JAIR MARINHO SANTOS
Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011
CPF: 393.673.953-87
Pref. Igarapé Grande/MA
Mat. 000011



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.811.637/0001-11

Certidão nº: 54861588/2023

Expedição: 07/10/2023, às 16:59:37

Validade: 04/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.811.637/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.811.637/0001-11
Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 112 / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2024 a 03/03/2024

Certificação Número: 2024020301220712022986

Informação obtida em 16/02/2024 12:59:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer N° 16020001/2024

Ilmo. Sr.
Auterli Araújo Silva
Sec. Mun. De Finanças
Nesta,

Assunto	Análise do Processo Administrativo de Pagamento.
Objeto	5º Medição- Construção de Unidades Habitacionais Padrão.
Credor	Construtora Uchoa Eireli
Valor R\$	288.439,84
ISSQN	5.768,80
LÍQUIDO R\$	282.671,04
Processo n°	16020001/2024

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar n° 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de N° 57, conforme segue em anexo neste parecer:

I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de prestação de serviços de Construção de 33 unidades habitacionais padrão, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Termo de recebimento provisório;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Solicitação de pagamento;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Planilha de medição de obra;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 16 de fevereiro de 2024


Cristiane Araújo de Sousa
Controladora Geral
CPF Nº. 609.928.413-30
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de
Habitações Populares
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 12010001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 625.254,40	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 12/01/2024	MODALIDADE..... global	Nº DA LICITAÇÃO... 001-2023-CONCO
SALDO ANTERIOR.... R\$ 625.254,40	VALOR PAGO..... R\$ 288.439,84	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 336.814,56

LIQUIDACÃO		
DATA 16/02/2024	NOTA DE LIQUIDACÃO 16020001	VALOR DA NF 288.439,84
	PAGAMENTO ATUAL 288.439,84	NOTA FISCAL serviço nº 68 série E de 16/02/2024

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16020001, de 16/02/2024

BANCO/FONTE
BB.....21.859-6 (FPM)
Desconto de ISSQN (talão de receita 16020003)

CHEQ/REF VALOR
282.671,04
5.768,80

Auterli Araújo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 288.439,84 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) referente a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA. Conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº120501001/2023, decorrente de concorrência pública nº001/2023. (PGTO REF A NF Nº68.)

Bom Lugar, 16 de Fevereiro de 2024

Assinatura
Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11



G3361616280889941
16/02/2024 16:33:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN BOM LUGAR FPM
Agência	528-2
Conta corrente	21859-6

Creditado

Nome	CONSTRUTORA UCHOA LTDA
Agência	2124-5
Conta corrente	80000-7
Valor	282.671,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	16/02/2024 16:05:27
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	16/02/2024 16:33:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 16020007
Data.....: 16/02/2024
Valor.....: 5.768,80
Código da despesa.: 006 ISSQN
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Histórico.....: PGTO REF A ISSQN

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800613
Valor.....: 5.768,80
Data da receita...: 16/02/2024
Número do talão...: 16020003
Contribuinte.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 12010001
Liquidação.....: 16020001
Ord. pgto.....: 16020001
Classificação.....: 4.4.90.51.00
Credor.....: UCHOA ENGENHARIA LTDA



AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3361616280889941
16/02/2024 16:36:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN BOM LUGAR FPM
Agência	528-2
Conta corrente	21859-6

Creditado

Nome	PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Agência	528-2
Conta corrente	21920-7
Valor	5.768,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	16/02/2024 16:35:28
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	16/02/2024 16:36:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06030001

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

DATA: 06/03/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 12010001 VALOR..... R\$ 625.254,40
DATA DO EMPENHO... 12/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, n° 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 244 0032 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de
Habitacões Populares
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão	336.514,56	336.514,56

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 336.514,56
Nota fiscal serviço 76 Série E
Chave de acesso
(estad./munic.): dy7hU0icq70tLI3Np154
HISTÓRICO.....LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº76.

Bom Lugar, 06 de Março de 2024.

Jose Oliveira Cesar

JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS

PROC. 0301001/2023

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, o Eng.º Civil VINICIUS MACHADO SANTOS, responsável técnico do contrato nº 120501001/2023, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o representante da empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, por seu representante legal, THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, procederam completa vistoria nos serviços executados, observando os projetos e especificações técnicas, para efeito de Recebimento Provisório dos serviços discriminados a seguir.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33 (trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Homologação: 14/04/2023

Publicação no Diário Oficial do Município - DOM: 14/04/2023

Data de assinatura do Contrato: 12/05/2023

Prazo de execução do Contrato: 180 dias

Data de recebimento da Ordem de Serviço: 12/05/2023

Valor contratado: R\$ 1.270.816,64 (um milhão e duzentos e setenta e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos)

Valor pago: R\$ 336.514,56 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos)

Termos aditivos: 1º termo de vigência, vigente até 05 de maio de 2024.

Bom Lugar (MA) 06 de março de 2024


VINICIUS MACHADO SANTOS
CREA-MA Nº 112101306-6
CPF: 073.614.733-00

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.03.06 14:22:17
-03'00'

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA Nº. 1118296079
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Termo de Recebimento Definitivo de Obras e Serviços executados no Município de Bom Lugar – MA contratados com a empresa UCHOA ENGENHARIA LTDA, conforme processo nº 0301001/2023

Contrato nº 120501001/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33 (trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Contratado: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Licitação: Concorrência

Processo Licitatório Concorrência: 001/2023

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra em referência, Eng.º VINICIUS MACHADO SANTOS, acompanhado do responsável técnico da contratada, reuniram-se no local da obra a fim de proceder a vistoria e exame dos serviços, bem como assinar o Termo de Recebimento Definitivo da mesma. Após detido exame de todos os serviços contratados, verificou-se que os mesmos foram executados satisfatoriamente, tudo de acordo com os projetos básico, complementares, planilha de quantitativos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro, constantes no contrato. A obra está, portanto, em condições de ser recebida definitivamente em conformidade com o contrato n.º 120501001/2023, Lei 14.133, Art. 140, Inciso I, alínea b.

Desta feita, expede-se o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Bom Lugar (MA) 06 de março de 2024


VINICIUS MACHADO SANTOS
CREA-MA N° 112101306-6
CPF: 073.614.733-00

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO:60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO:60474539377
Dados: 2024.03.06 14:22:34
+03'00'

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
CREA N°. 1118296079
CONSTRUTORA UCHOA EIRELI



Estado do Maranhão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Rua Manoel Severo, S/N, Centro
15.529.541/0001-89

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400257

A
UCHOA ENGENHARIA LTDA
Rua São Francisco, nº 112
CENTRO - Igarapé Grande/MA

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA

Processo de compra: Licitação na modalidade Concorrência nº 001-2023-CONCO - Contrato nº 120501001/2023

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 27/02/2023, empenho nº 12010001, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão Especificação: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 87(oitenta e sete) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.		1,0000	336.514,560	336.514,56
TOTAL.:					336.514,56

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Concorrência nº 001-2023-CONCO), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.529.541/0001-89.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no
Pag.: 0001



dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 06 de Março de 2024

FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
C.N.P.J. (MF). 15.529.541/0001-89

Ciente e de acordo em ____/____/____.

UCHOA ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J(MF) 10.811.637/0001-11



IGARAPÉ GRANDE – MA, 06 DE MARÇO DE 2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

A UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, SITUADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, CEP 65.720-000, IGARAPÉ GRANDE –MA, TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SRA. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, BRASILEIRA, CASADA, NATURAL DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0 E CPF Nº 604.745.393-77, VEM POR MEIO DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE NOS DADOS ABAIXO:

6ª MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

VALOR DO OBJETO: R\$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR DO ADITIVO: R\$124.328,88 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

VALOR A IMPORTAR: R\$336.514.56 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11

TERMO DE CONTRATO Nº 120501001/2023

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 2124-5

CONTA CORRENTE 80000-7

BANCO DO BRASIL

NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVÃO: 60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVÃO: 60474539377
Dados: 2024.03.06 14:20:41
+03'00"

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
CPF: 604.745.393-77
REPRESENTANTE LEGAL



99 98407.7832



construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Para verificar autenticidade desta Nota, escaneie o QR Code ao lado. Ou acessando o link:



<https://nfse.igarapegrande.ma.gov.br/autenticar>

NÚMERO DA NOTA: 0076
EMIÇÃO: 06/03/2024 14:12:15
CÓDIGO VERIFICADOR: dY7hU0iCq70tL3Np154

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ: 10.811.637/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO Nº: 112
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
CPF / CNPJ: 01.611.400/0001-04
ENDEREÇO: RUA MANOEL SEVERO Nº: s/n
MUNICÍPIO: IGARAPÉ GRANDE UF: MA
E-MAIL: uchoaeng.edifica@gmail.com

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☒ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 06/03/2024

Ysaí Oliveira César
José Oliveira César
Matrícula nº 1432-1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

6ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 120501001/2023 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

Descrição	Quantidade	Valor	Valor total
CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	1	R\$ 336.514,56	R\$ 336.514,56
PIS (0,00%)			
COFINS (0,00%)			
INSS (0,00%)			
IR (0,00%)			
CSLL (0,00%)			
*R\$ 0,00	*R\$ 0,00	*R\$ 0,00	*R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 336.514,56

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 336.514,56	2,00%	R\$ RS 6.730,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 3/2024 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: BOM LUGAR - MA
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SERVIÇO: 702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCR
INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO: Paga em 06/03/2024 15:41:35 na guia Nº 3202410381

Expedido(a) em: 06/03/2024 15:43:58

Atesto

- ☐ Os materiais foram recebidos
☒ Os Serviços foram prestados
☒ As despesas foram realizadas

Em 06/03/2024

Vinicius Machado Santos
Vinicius Machado Santos
Matrícula nº 2249-1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230669215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

VINICIUS MACHADO SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1121013066

Registro: 1121013066MA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOM LUGAR

RUA Manoel Severo

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Bairro: centro

UF: MA

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

Nº: sn

CEP: 65704000

Contrato: 120501001/2023

Valor: R\$ 1.270.816,64

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 12/05/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA manoel severo

Complemento:

Cidade: BOM LUGAR

Data de Início: 12/05/2023

Previsão de término: 12/11/2023

Bairro: centro

UF: MA

Coordenadas Geográficas: -4.371670, -45.032134

CEP: 65704000

Finalidade: Residencial

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	33.00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	33.00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	33.00	un
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	33.00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	33.00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	33.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização da prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

AEAMA - ASSOC. DOS ENG. AGRON. DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bom Lugar-MA, 27 de julho de 2023

Local

data

Vinicius Machado Santos

VINICIUS MACHADO SANTOS - CPF: 073.614.733-00

Edmar B. de Oliveira

MUNICIPIO DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59

Registrada em: 27/07/2023

Valor pago: R\$ 254,59


Nosso Número: 8304871432

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Zb04
impresso em: 27/07/2023 às 09:37:56 por: ip: 192.168.100.1

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Processo: 0304004 / 2013
Fls.: 52
Rubrica: 0

Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230644614

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1118296079

Registro: 1118296079MA

Empresa contratada: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005403022-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

RUA MANOEL SEVERO

Nº: SN

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM LUGAR

UF: MA

CEP: 65704000

Contrato: 120501001/2023

Celebrado em: 12/05/2023

Valor: R\$ 1.270.816,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL SEVERO

Nº: SN

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro: CENTRO

Cidade: BOM LUGAR

UF: MA

CEP: 65704000

Data de início: 12/05/2023

Previsão de término: 08/11/2023

Coordenadas Geográficas: -4.371570, -45.032134

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

CPF/CNPJ: 01.611.400/0001-04

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA	33.00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	33.00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	33.00	un
49 - Execução de obra > ELETROTECNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	33.00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	33.00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	33.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA.

6. Declarações

- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.gilac.com.br/publico/> com a chave: z9wb4
Impresso em: 15/09/2023 às 13:58:21 por: ip: 200.25.52.196

www.crea-ma.org.br

faleconosco@crea-ma.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Processo: 020100-120-83
Fls.: 23
Rubrica: ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230644614

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVAO-60474539377

Assinado de forma digital
por THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA UCHOA
GALVAO-60474539377
Dados: 2023.05.15 14:59:34
+03:00

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão de 15/05/2023 de 15/05
Local data

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO - CPF

604.745.393-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - CNPJ: 01.611.400/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 15/05/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8304716204

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 29w64
Impresso em: 15/05/2023 às 13:58:21 por: ip: 200.25.52.196



www.crea-ma.org.br
Tel.: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
DATA DE INÍCIO		DATA DE FIM		PERÍODO	MEDICÃO
		quarta-feira, 6 de março de 2024			006
PÁGINA		001 de 001			
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR				
CONTRATADO	UCHOA ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 10.811.637/0001-11.				
CONTRATO	Nº 120501001/2023				
ENDEREÇO	BOM LUGAR-MA				

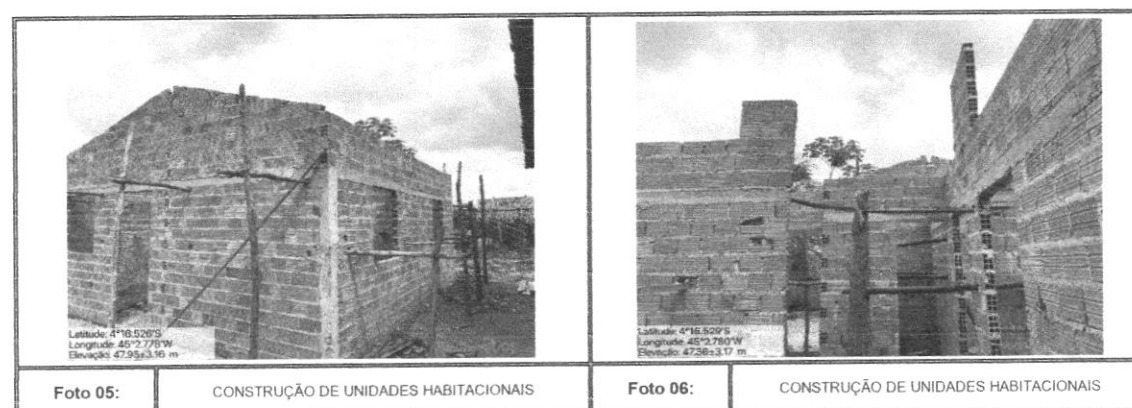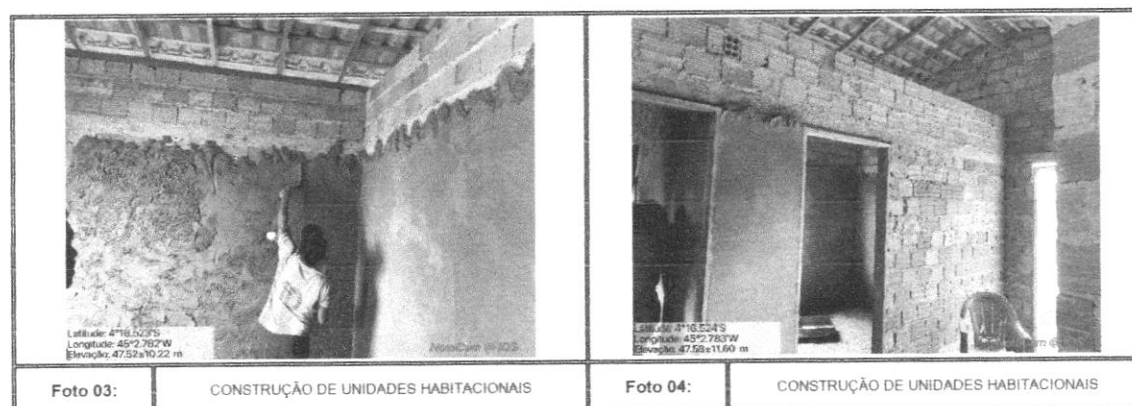

UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112 - CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEPHONE: (99) 98407-7832 - EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

ITEM			CONTRATO + 2º ADITIVO														ACUMUL. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO ATUAL				SALDO ATUAL			
		CÓDIGO		FONTE		DESCRIÇÃO		UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANT	I	J	K	%	QUANT	L	M	N	O	P	Q	%	QUANT	R	S	T	%			
A	B	C	D	E	F	G	H																									
1 SERVIÇOS INICIAIS																																
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF. 05/2018	m²	1.980,00	R\$ 2,53	R\$ 5.009,03		1560,00	R\$ 3.946,49	78,79%	R\$ 1.062,54	21,21%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	R\$ 5.009,03	100,00%	
2 MOVIMENTO DE TERRA																																
2.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	m³	165,00	R\$ 80,31	R\$ 13.250,76		130,00	R\$ 10.439,95	78,79%	R\$ 2.810,81	21,21%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	R\$ 13.250,76	100,00%	
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	m³	99,00	R\$ 41,42	R\$ 4.100,60		78,00	R\$ 3.230,76	78,79%	R\$ 869,84	21,21%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	R\$ 4.100,60	100,00%	
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA																																
3.1	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BEIÃO, AF. 05/2020 - ALUCHE E BALNEÁRIE	m³	65,00	R\$ 909,66	R\$ 60.037,80		52,00	R\$ 47.302,49	78,79%	R\$ 12.735,31	21,21%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	R\$ 60.037,80	100,00%	
3.2	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021 - ELEMENTOS, SAPATAS, PILARES, VIGAS, SUPERIORES E INFERIORES/ LAJES	m³	127,05	R\$ 700,86	R\$ 89.044,27		100,10	R\$ 70.156,06	78,79%	R\$ 18.888,21	21,21%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	R\$ 89.044,27	100,00%	
4 ALVENARIA E PAINÉIS																																
4.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	m²	2.363,32	R\$ 108,29	R\$ 255.926,86		1.736,92	R\$ 188.092,56	73,49%	R\$ 67.834,30	26,51%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	R\$ 255.926,86	100,00%	
5 COBERTURA																																
5.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	1.650,00	R\$ 76,74	R\$ 126.623,72		1.300,00	R\$ 99.764,12	78,79%	R\$ 26.859,60	21,21%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	R\$ 126.623,72	100,00%	
5.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	1.650,00	R\$ 47,48	R\$ 78.339,91		1.300,00	R\$ 61.722,34	78,79%	R\$ 16.617,57	21,21%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	R\$ 78.339,91	100,00%	
5.3	94224	SINAPI	EMBOCCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF. 07/2019	M	1.029,60	R\$ 22,70	R\$ 23.367,94		811,20	R\$ 18.411,07	78,79%	R\$ 4.956,87	21,21%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	R\$ 23.367,94	100,00%	
5.4	94221	SINAPI	CUNHEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	270,60	R\$ 24,56	R\$ 6.646,64		213,20	R\$ 5.236,74	78,79%	R\$ 1.409,90	21,21%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	R\$ 6.646,64	100,00%	
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E CHAPA GALVANIZADA																																
6.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÓDIO, 80X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	66,00	R\$ 857,28	R\$ 56.580,35		52,00	R\$ 44.578,43	78,79%	R\$ 12.001,92	21,21%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	R\$ 56.580,35	100,00%	
6.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÓDIO, 80X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	82,50	R\$ 1.065,51	R\$ 87.904,25		65,00	R\$ 69.257,88	78,79%	R\$ 18.646,37	21,21%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	R\$ 87.904,25	100,00%	

THAYLA CRISTINA
GOMES DA ROCHA
UCHOA
GALVÃO-60474539

23442

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112 - CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA

TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832 - EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO	
6ª MEDIÇÃO 06/03/2024	CONTRATO Nº 120501001/2023 ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230644614 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO, NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA. VALOR DO OBJETO: R\$ 1.270.816,64 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SETENTA E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). VALOR DO ADITIVO: R\$124.328,88 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11 RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE-MA TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	

6.3	100669	SINAPI	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	49,76	m²	R\$ 1.271,98	R\$ 63.293,50	30,72	R\$ 39.075,09	61,74%	19,04	R\$ 24.218,41	38,26%	49,76	R\$ 63.293,50	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7	PISOS																		
7.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADFRIDO, ACABAMENTO NAOFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	1.320,00	m²	R\$ 36,22	R\$ 47.816,43	1040,00	R\$ 37.673,53	78,79%	280,00	R\$ 10.142,90	21,21%	1320,00	R\$ 47.816,43	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	1.320,00	m²	R\$ 38,36	R\$ 50.633,29	1040,00	R\$ 39.892,88	78,79%	280,00	R\$ 10.740,41	21,21%	1320,00	R\$ 50.633,29	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8	REVESTIMENTO																		
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	4.326,65	m²	R\$ 8,45	R\$ 36.567,90	3073,84	R\$ 25.979,42	71,04%	1252,81	R\$ 10.588,48	28,96%	4326,65	R\$ 36.567,90	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF. 08/2022	2.023,24	m²	R\$ 39,75	R\$ 80.421,33	1256,88	R\$ 49.959,48	62,12%	766,36	R\$ 30.461,85	37,88%	2023,24	R\$ 80.421,33	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																		
9.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	116,49	M	R\$ 21,32	R\$ 2.483,21	91,78	R\$ 1.956,45	78,79%	24,71	R\$ 526,76	21,21%	116,49	R\$ 2.483,21	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	943,47	M	R\$ 21,73	R\$ 20.500,76	743,34	R\$ 16.152,10	78,79%	200,13	R\$ 4.348,66	21,21%	943,47	R\$ 20.500,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.3	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	99,00	UN	R\$ 137,00	R\$ 13.563,23	78,00	R\$ 10.686,17	78,79%	21,00	R\$ 2.877,06	21,21%	99,00	R\$ 13.563,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	33,00	UN	R\$ 174,09	R\$ 5.745,07	26,00	R\$ 4.526,39	78,79%	7,00	R\$ 1.218,68	21,21%	33,00	R\$ 5.745,07	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	33,00	UN	R\$ 137,00	R\$ 4.521,07	26,00	R\$ 3.562,04	78,79%	7,00	R\$ 959,03	21,21%	33,00	R\$ 4.521,07	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.6	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVALÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	33,00	UN	R\$ 108,50	R\$ 3.580,49	26,00	R\$ 2.820,95	78,79%	7,00	R\$ 759,54	21,21%	33,00	R\$ 3.580,49	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.7	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	33,00	UN	R\$ 29,81	R\$ 983,72	26,00	R\$ 775,01	78,78%	7,00	R\$ 208,71	21,22%	33,00	R\$ 983,72	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.8	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOTA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	33,00	UN	R\$ 186,10	R\$ 6.141,39	26,00	R\$ 4.838,65	78,79%	7,00	R\$ 1.302,74	21,21%	33,00	R\$ 6.141,39	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	198,00	M	R\$ 45,35	R\$ 8.979,83	156,00	R\$ 7.074,99	78,79%	42,00	R\$ 1.904,84	21,21%	198,00	R\$ 8.979,83	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	396,00	M	R\$ 77,24	R\$ 30.788,25	312,00	R\$ 8.499,82	78,75%	84,00	R\$ 2.288,43	21,21%	396,00	R\$ 30.788,25	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.11	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	66,00	UN	R\$ 21,14	R\$ 1.395,45	52,00	R\$ 1.099,41	78,79%	14,00	R\$ 256,04	21,21%	66,00	R\$ 1.395,45	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98407-7832- EMAIL: UCHOA.GALVAO.CONSTRUTORA@GMAIL.COM

PORTA O VALOR DA PRESENTE MEDIÇÃO EM: R\$336.514,56 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

TELEPHONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832 - EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 10.811.637/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:35:11 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **F045.E22B.A8CD.FA51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007524/24

Data da

27/01/2024 09:19:23

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/02/2024 11:12:50



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 333259/23

Data da

16/11/2023 15:37:11

Inscrição Estadual: 123145635

CPF/CNPJ: 10811637000111

Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 112 CEP: 65720000 - CENTRO

Telefone: (99)36471162

Município: IGARAPE GRANDE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Av. João Carvalho, S/N, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPÉ GRANDE
Rua São Francisco, s/nº
CEP 65.720-000
Igarapé Grande - Maranhão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 021/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas nos arquivos desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não tem nenhum debito municipal sob quaisquer impostos que exista (IPTU, TST, TCF, ISSQN, TLVF, FORUS e LAVAÉMIOS), a esta Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CPF: 198.673.953-87

Jair Marinho Santos
DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO
Pref. Mun. Igarapé Grande/MA
Mat. 0000011



ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé Grande

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças – SEMAD.

Av. João Carvalho, S/N, Centro, CEP 65.720-000

CNPJ: 06.323.208/0001-28

06.323.208/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE

IGARAPÉ GRANDE

Rua São Francisco, 112

CEP 65.720-000

Igarapé Grande, Maranhão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 021/2024

Certificamos após a realização das consultas procedidas no sistema desta Prefeitura Municipal, consubstanciado pelo Art. 240 e 242 da Lei nº 7799, de 19/12/2002 e disposto no Art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966, constatamos que não há quaisquer débitos de inscritos em dívidas ativas até a presente data sobre o referido contribuinte, Fazenda Municipal, até a presente data sobre o referido contribuinte, **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11 Localizada na Rua São Francisco, 112, Centro - Igarapé Grande/MA.

Este documento é válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

IGARAPÉ GRANDE - MA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

JAIR MARINHO SANTOS

Dir. Geral de Departamento – Mat. 0000011

CNPJ: 06.323.208/0001-28

DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTO

Pref. Mun. Igarapé Grande/MA

Mat. 0000011

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.811.637/0001-11
Razão Social: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 112 / CENTRO / IGARAPE GRANDE / MA / 65720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2024 a 22/03/2024

Certificação Número: 2024022204181173855638

Informação obtida em 29/02/2024 15:55:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.811.637/0001-11

Certidão nº: 13868006/2024

Expedição: 29/02/2024, às 16:06:44

Validade: 27/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UCHOA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.811.637/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer Nº 06030001/2024

Ilmo. Sr.
Auterli Araújo Silva
Sec. Mun. De Finanças
Nesta,

Assunto	Análise do Processo Administrativo de Pagamento.
Objeto	6º Medição- Construção de Unidades Habitacionais Padrão.
Credor	Construtora Uchoa Eireli
Valor R\$	336.514,56
ISSQN	6.730,32
LÍQUIDO R\$	329.784,87
Processo nº	06030001/2024

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 76, conforme segue em anexo neste parecer:

I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de prestação de serviços de Construção de 33 unidades habitacionais padrão, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Termo de recebimento provisório;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Solicitação de pagamento;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Planilha de medição de obra;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.


Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 06 de março de 2023


Cristiane Araújo de Sousa
Controladora Geral
CPF Nº. 609.928.413-30
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de
Habitações Populares
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

NOTA DE EMPENHO Nº 12010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 625.254,40 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência
DATA DO EMPENHO... 12/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... 001-2023-CONCO
SALDO ANTERIOR.... R\$ 336.814,56 VALOR PAGO..... R\$ 230.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 106.814,56

LIQUIDAÇÃO
DATA 06/03/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06030001 VALOR DA NF 336.514,56 PAGAMENTO ATUAL 230.000,00 NOTA FISCAL
serviço nº 76 série E de 06/03/2023

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSE OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08030052, de 08/03/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....21.920-7 (PM ARRECAÇÃO) 230.000,00

Auterli Araujo Silva
AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais) referente a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA. Conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº120501001/2023, decorrente de concorrência pública nº001/2023. (PGTO REF A NFS Nº76.)

Bom Lugar, 08 de Março de 2024

Assinatura
Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J... 10.811.637/0001-11



G3320711430308381
07/03/2024 11:49:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BOM LUGAR ARRECADACAO
Agência	528-2
Conta corrente	21920-7

Creditado

Nome	CONSTRUTORA UCHOA LTDA
Agência	2124-5
Conta corrente	80000-7
Valor	230.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	06/03/2024 17:08:54
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	07/03/2024 11:49:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.



CUIDANDO DA GENTE

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.13. Fundo Municipal de Assistência Social
CLASSIFICAÇÃO 08 244 0032 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de
Habitacões Populares
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

DADOS DO EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO Nº 12010001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 625.254,40
DATA DO EMPENHO... 12/01/2024	MODALIDADE..... global
TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Concorrência	
Nº DA LICITAÇÃO... 001-2023-CONCO	
SALDO ANTERIOR... R\$ 336.814,56	VALOR PAGO..... R\$ 106.514,56
SALDO DO EMPENHO.. R\$ 230.300,00	

LIQUIDAÇÃO		
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF
06/03/2024	06030001	336.514,56
PAGAMENTO ATUAL		106.514,56
NOTA FISCAL		
serviço nº 76 série E de 06/03/2023		

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

Jose Oliveira Cesar
JOSÉ OLIVEIRA CÉSAR
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Fabiane Beatriz de Oliveira
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 06030020, de 06/03/2024

BANCO/FONTE
BB.....34.222-X (ICMS)
Desconto de ISSQN (talão de receita 06030022)

CHEQ/REF VALOR
99.784,27
6.730,29

Auterli Araujo Silva
AUTERLI ARAÚJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 106.514,56 (Cento e Seis Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Seis Centavos) referente a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Construção de 33(trinta e três) Unidades Habitacionais Padrão, no município de Bom Lugar/MA. Conforme 2º Segundo Termo Aditivo ao contrato nº120501001/2023, decorrente de concorrência pública nº001/2023. (PGTO REF NFS 76.)

Bom Lugar, 06 de Março de 2024

Assinatura
Credor.... UCHOA ENGENHARIA LTDA
Endereço.. Rua São Francisco, nº 112, CENTRO-Igarapé Grande-MA 65720-000
C.N.P.J.... 10.811.637/0001-11



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Bom Lugar
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Exercício de 2024

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 15030008
Data: 15/03/2024
Valor: 6.730,29
Código da despesa: 006 ISSQN
Credor: UCHOA ENGENHARIA LTDA
Histórico: PGTO REF A ISSQN DA NFS Nº76 - UCHOA ENGENHARIA.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita: 15800613
Valor: 6.730,29
Data da receita: 06/03/2024
Número do talão: 06030022
Contribuinte: UCHOA ENGENHARIA LTDA

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 12010001
Liquidação: 06030001
Ord. pgto: 07030006
Classificação: 4.4.90.51.00
Credor: UCHOA ENGENHARIA LTDA


AUTERLI ARAUJO SILVA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



G3370617062847261
06/03/2024 17:16:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMBL-ICMS
Agência	528-2
Conta corrente	34222-X

Creditado

Nome	CONSTRUTORA UCHOA LTDA
Agência	2124-5
Conta corrente	80000-7
Valor	99.784,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE664331AUTERLI ARAUJO SILVA	06/03/2024 17:10:08
	JF237445TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO	06/03/2024 17:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF237445 TASSIO VINICIUS LIMA DE MELO.
